



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Voortgang dijkversterking

Regionaal bestuurlijk overleg
3 februari 2017



Op dit moment vindt bestuurlijke afstemming plaats over de politiek gevoelige punten in het Ontwerp Projectplan

- Kan gevolgen hebben voor de planning

Presentatie:

- Ontwerp planproducten
- Participatie met bewoners en communicatie
- Voorbereiding openbare procedure

Ontwerp planproducten eind februari gereed

- Verwerken commentaren bestuurlijke partners
- Interne en externe kwaliteitsborging

Formele planproducten

- Projectplan Waterwet (dijkversterkingsplan)
- MER (verplichte toets milieu-effecten)
- Ruimtelijke Onderbouwing (opheffen strijdigheid met huidige bestemmingsplannen)
- Natuurrapportages (toets aan regelgeving)
- Vergunningaanvragen (o.a. provinciaal monument)

Overige documenten

- Oplegnotitie (o.a. uitwerking DO als parallel proces)
- Termijnagenda (o.a. programma Ruimtelijke kwaliteit)
- Bestuurlijke afspraken (o.a. HHNK-provincie, addendum SOK Hoorn)

Participatie en communicatie - terugblik

Participatie in een roerige omgeving

- Basis vormde Ontwerp- en participatieladder (2015)
- Maatwerk waar dat nodig was

Activiteiten

- Omgevingsbijeenkomsten in alle modules over principeoplossingen (september/oktober 2016)
- Maatwerk: o.a. inloopbijeenkomsten Zeevang, ateliers Uitdam, verdiepingstraject Durgerdam, keukentafelgesprekken Hoorn en Scharwoude (vanaf juli 2016)
- Afsluitende inloopmarkten (8 en 14 februari)
- Participatie in Uitdam en Durgerdam loopt nog door
- Adviesgroep (advies aan bestuur HHNK medio februari)
- Klankbordgroep Bewezen Sterkte

Participatie en communicatie

- leerpunten

1. Adviseren over globaal ontwerp geeft spanning

PPW is globaal planfiguur, wensen en ideeën van belanghebbenden zijn relatief gedetailleerd. Deze komen pas aan de orde in DO. Maar de bestuurlijke partners moeten nu adviseren over het plan. Dat geeft spanning. Ditzelfde geldt voor de bewoners/ zienswijzen.

2. Bestuurlijke partners onvoldoende aangehaakt

Participatie vond vooral plaats met bewoners en belangengroepen, bestuurlijke partners zijn onvoldoende meegenomen.

3. Maatwerk in participatie leidde soms tot onrust

Maatwerkactiviteiten speelden in op behoeften uit omgeving. Dat was positief, maar had als keerzijde dat het flexibel meebewegen soms ook leidde tot procesonzekerheid.

4. Informatievoorziening via meerdere kanalen positief

Brede informatievoorziening werkte goed: e-nieuwsbrief, website, keukentafel-gesprekken, presentaties, informatiemarkten.

Participatie en communicatie

- vooruitblik



Participatieaanpak voor volgende ontwerpfase geactualiseerd

- Evaluatie door externe partij, wensen bestuurlijke partners
- Planning wacht op bestuurlijke afstemming

Activiteiten

- Afsluitende inloopmarkten over OPPW (8 en 14 februari)
- Maatwerktrajecten Uitdam en Durgerdam
- Bijeenkomsten rond start formele inspraak
 - Bijeenkomst raden/staten, bijeenkomsten voor bewoners
- Terugkoppeling aan belanghebbenden over eerder ingebrachte wensen en ideeën (bij start inspraak)
 - Opties: plek gekregen in OPPW, geen plek gekregen, komt aan de orde in DO/UO
- Participatie per module in uitwerking Definitief Ontwerp (DO) (vanaf april)
 - Zowel bestuurlijke partners als bewoners

Openbare procedure goed samenspel tussen provincie en HHNK

- Parallel vindt uitwerking Definitief Ontwerp plaats
- Planning wacht op bestuurlijke afstemming

Stappen


- GS: Coördinatiebesluit
- Programmabureau HWBP-2: C3a-procedure (tot eind feb)
- Besluitvorming HHNK
- Besluitvorming provincie
- Ter inzagelegging ontwerp planproducten (6 weken)
- Ontvangen zienswijzen, Nota van beantwoording
- Aanpassingen tot definitieve planproducten
- Besluitvorming HHNK
- Besluitvorming provincie
- Ter inzagelegging t.b.v. beroepsprocedure (6 weken)
- Raad van State: Behandeling van evt. beroepen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Relatie procedure OPPW en DO

- parallel proces

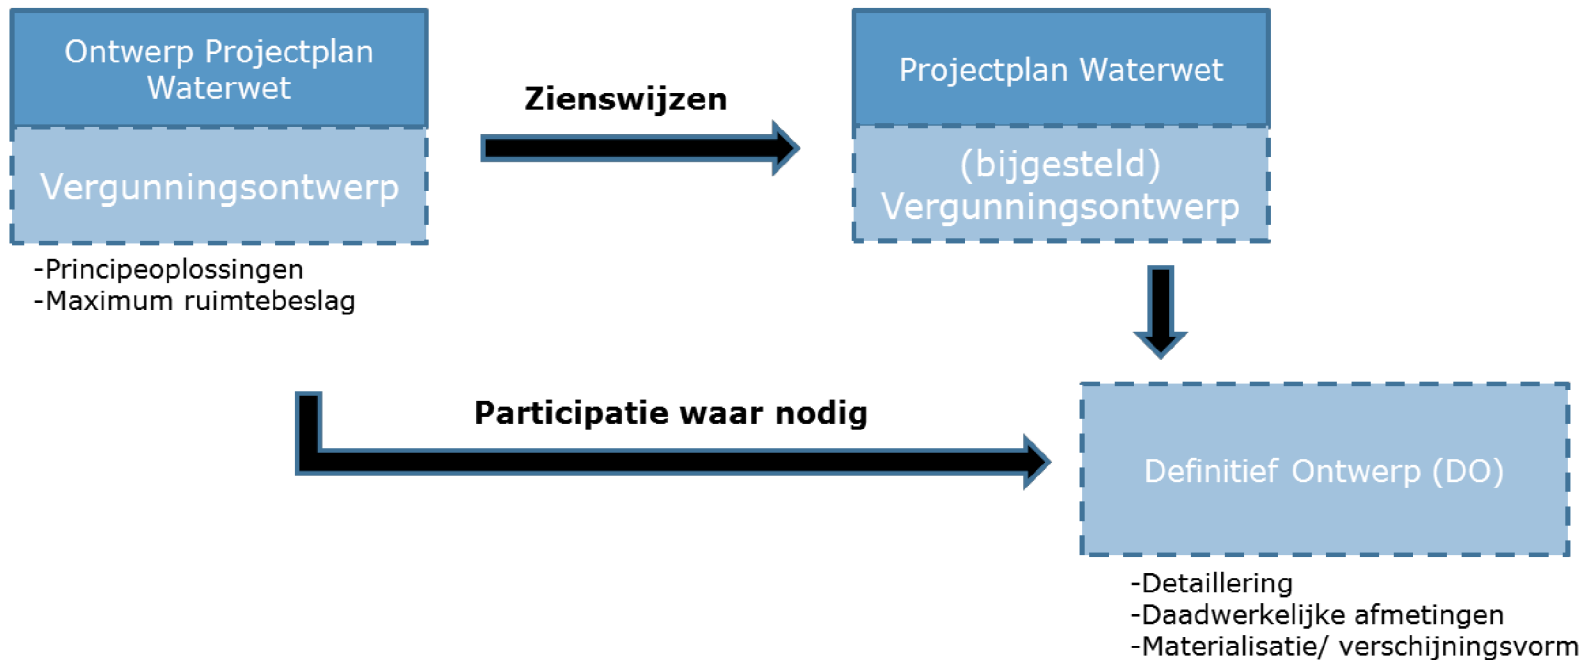

Inbreng alle belanghebbenden zowel in Projectplan Waterwet als Definitief Ontwerp
