Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Duur
1	**Voorbereidingskrediet**	**don 2-2-12**	**maa 12-3-12**	**28 dagen**
2	college advies	don 2-2-12	din 7-2-12	4 dagen
3	commissie B&B	woe 8-2-12	maa 20-2-12	9 dagen
4	raadsbesluit	woe 29-2-12	maa 12-3-12	9 dagen
5	vooroverleg brandweer	din 28-2-12	din 28-2-12	1 dag
6	overleg gebruikers	woe 29-2-12	woe 29-2-12	1 dag
7	**omgevings vergunning**	**din 28-2-12**	**din 28-8-12**	**121 dagen**
8	voorbereiding	din 28-2-12	maa 12-3-12	10 dagen
9	aanvraag	vri 30-3-12	vri 30-3-12	1 dag
10	procedure tijd	maa 2-4-12	din 28-8-12	40 dagen
11	uitzetten offerte aanvragen derde	don 1-3-12	woe 14-3-12	10 dagen
12	college voorstel opdracht derde	don 15-3-12	din 20-3-12	4 dagen
13	start adviseurs	woe 21-3-12	woe 11-4-12	15 dagen
14	bespreken voorstellen college	maa 13-8-12	don 16-8-12	4 dagen
15	uitwerken keuzes	vri 17-8-12	don 23-8-12	5 dagen
16	grondonderzoek	maa 19-3-12	vri 23-3-12	5 dagen
17	asbest inventarisatie	din 23-10-12	maa 5-11-12	10 dagen
18	uitwerken plannen	maa 12-11-12	vri 30-11-12	15 dagen
19	afstemmen plannen en wensen	maa 26-11-12	vri 30-11-12	5 dagen
20	kredietramingen	maa 3-12-12	vri 14-12-12	10 dagen
21	samen voegen adviezen	maa 17-12-12	vri 21-12-12	5 dagen
22	kerstvakantie	maa 24-12-12	din 1-1-13	7 dagen
23	**Krediet raad februari**	**don 3-1-13**	**maa 11-2-13**	**28 dagen**
24	college voorstel krediet	don 3-1-13	din 8-1-13	4 dagen
25	commissie B&B	woe 9-1-13	maa 21-1-13	9 dagen
26	raadsbesluit krediet	woe 30-1-13	maa 11-2-13	9 dagen
27	bestek en tekeningen	maa 7-1-13	vri 8-2-13	25 dagen
28	**aanbesteding**	**woe 30-1-13**	**vri 12-4-13**	**53 dagen**
35	start bouwvoorbereiding	maa 15-4-13	vri 26-4-13	10 dagen
36	bouwwerkzaamheden buiten verlet	maa 29-4-13	vri 19-7-13	60 dagen
37	bouwwerkzaamheden in gesloten	maa 8-7-13	vri 16-8-13	30 dagen

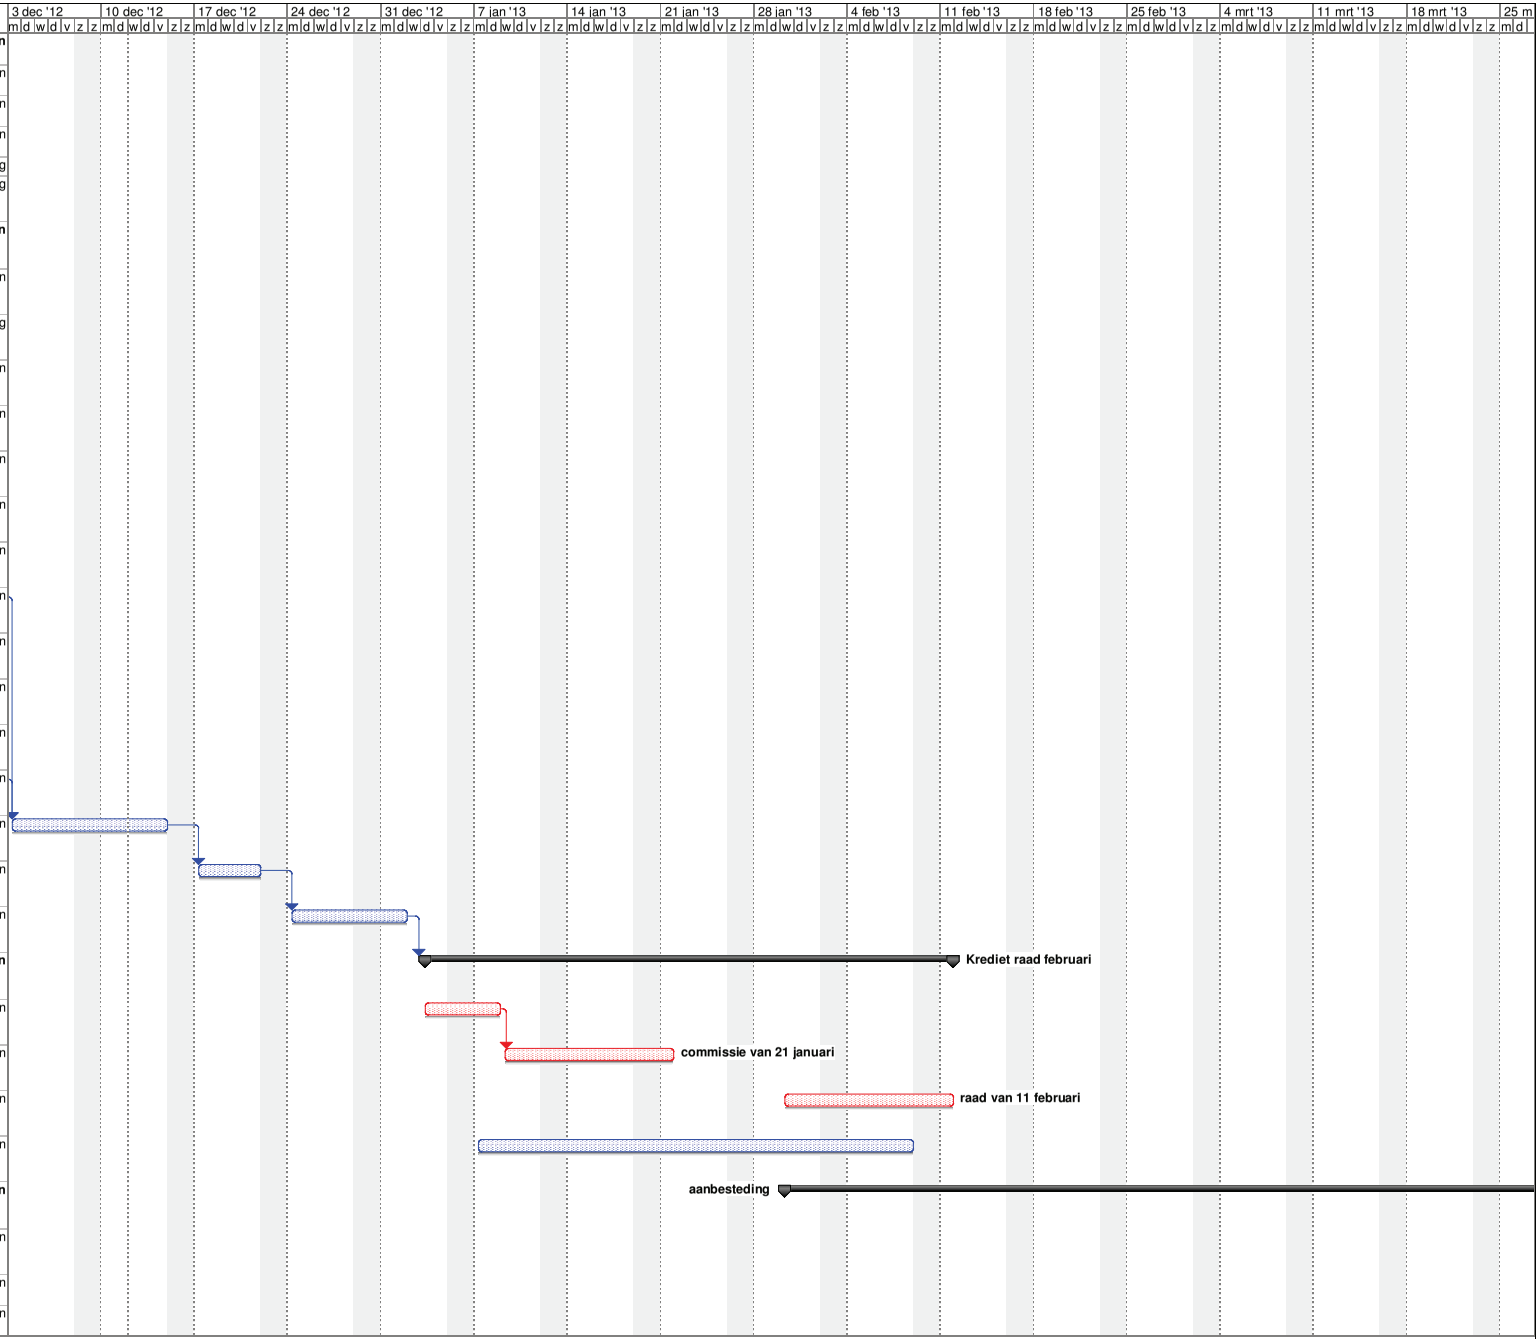

Project: Sporthal-zwembad.mpp
Datum: woe 12-12-12

Taak
Splitsing
Voortgang
Mijlpaal
Samenvatting
Projectsamenvatting
Splitsing
Voortgang
Mijlpaal
